


CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE CORURIBE  
PROC. ADM. 36.915/2013

- PLANEJADO PARA 5ª MEDIÇÃO: R\$ 144.233,48
- 5ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 62.836,22
- DISCREPÂNCIA: 81.397,26
- ATINGIU: 43,57% DA META

- PLANEJADO PARA 6ª MEDIÇÃO: R\$ 181.172,00
- 6ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 32.983,87
- DISCREPÂNCIA: 148.188,13
- ATINGIU: 18,21% DA META

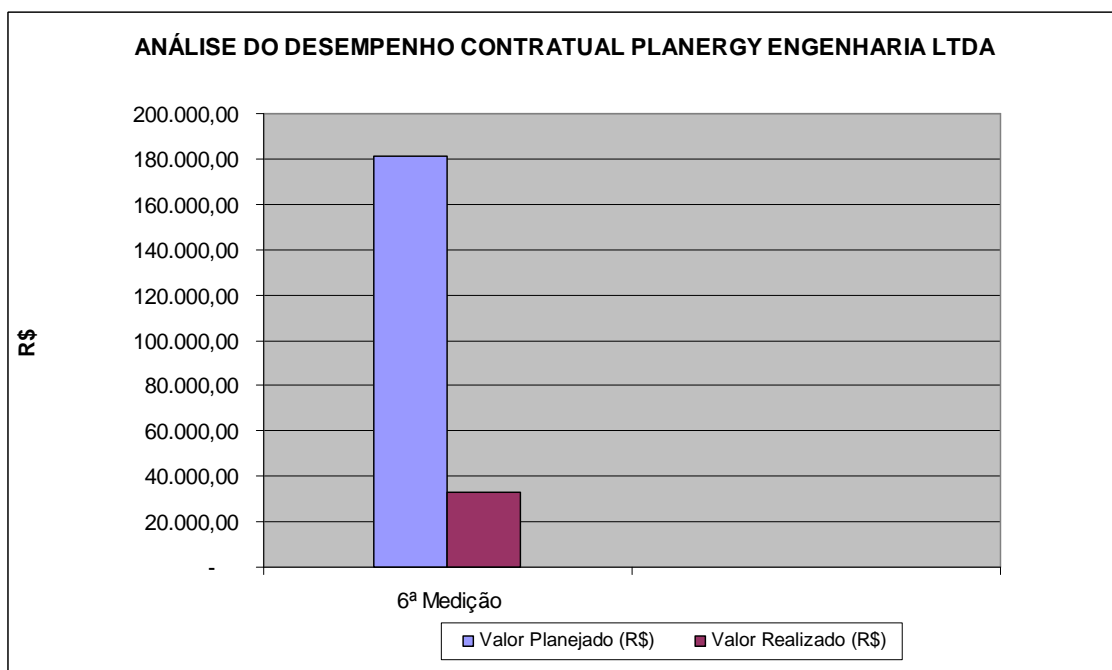

Thiago Pontes de Alencar  
Fiscal Substituto do Contrato
