


REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO DE ARAPIRACA
PROC. ADM. 31831/2013

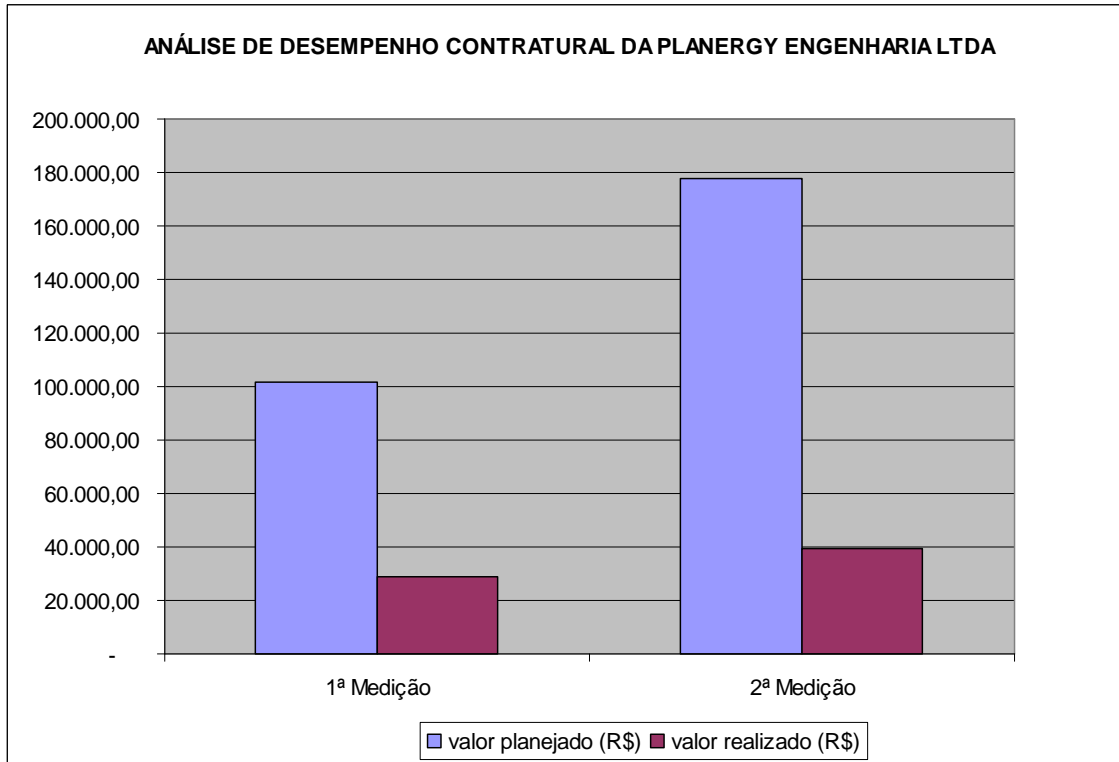

- PLANEJADO PARA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 101.704,32
- 1ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 28.654,84
- DISCREPÂNCIA: 73.049,48
- ATINGIU 28,17% DA META

- PLANEJADO PARA 2ª MEDIÇÃO: R\$ 177.995,70
- 1ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 39.343,67
- DISCREPÂNCIA: 138652,03
- ATINGIU 22,10% DA META
