


REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO DE ARAPIRACA
PROC. ADM. 31831/2013

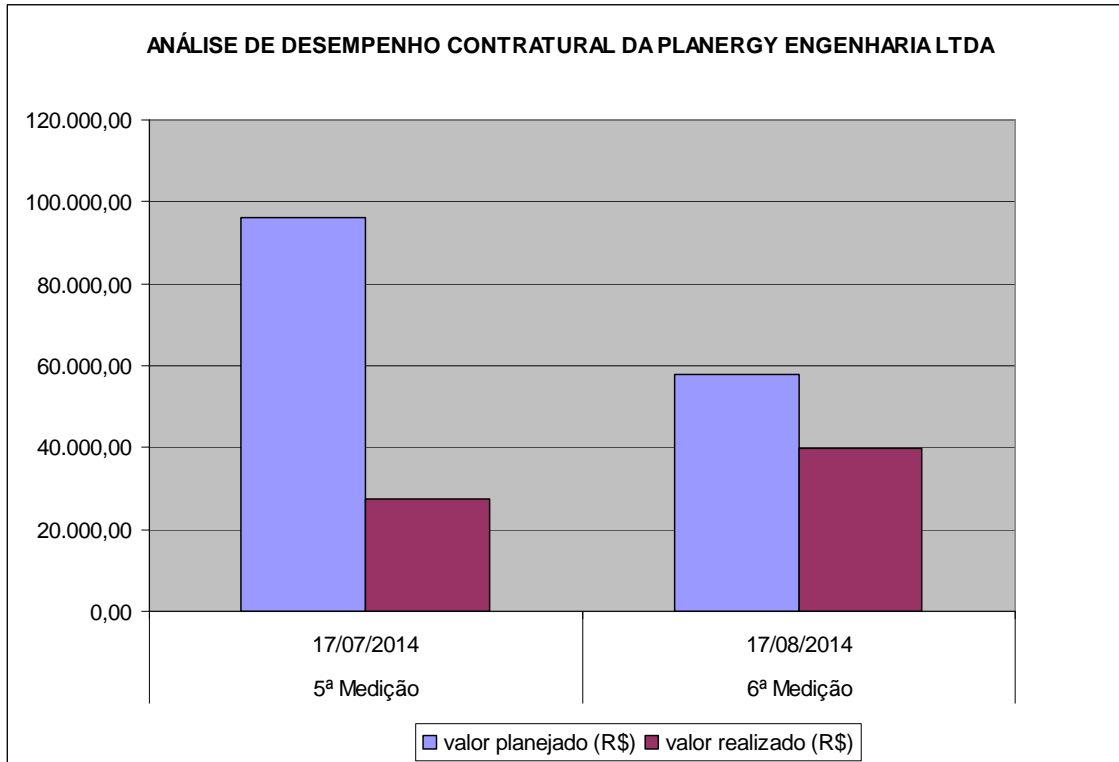

- PLANEJADO PARA 5ª MEDIÇÃO: R\$ 96.083,67
- 5ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 27.350,16
- DISCREPÂNCIA: 68.733,51
- ATINGIU 28,38% DA META

- PLANEJADO PARA 6ª MEDIÇÃO: R\$ 57.847,66
- 6ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 39.854,61
- DISCREPÂNCIA: 17.993,05
- ATINGIU 68,90% DA META
